


配置図



工事現況

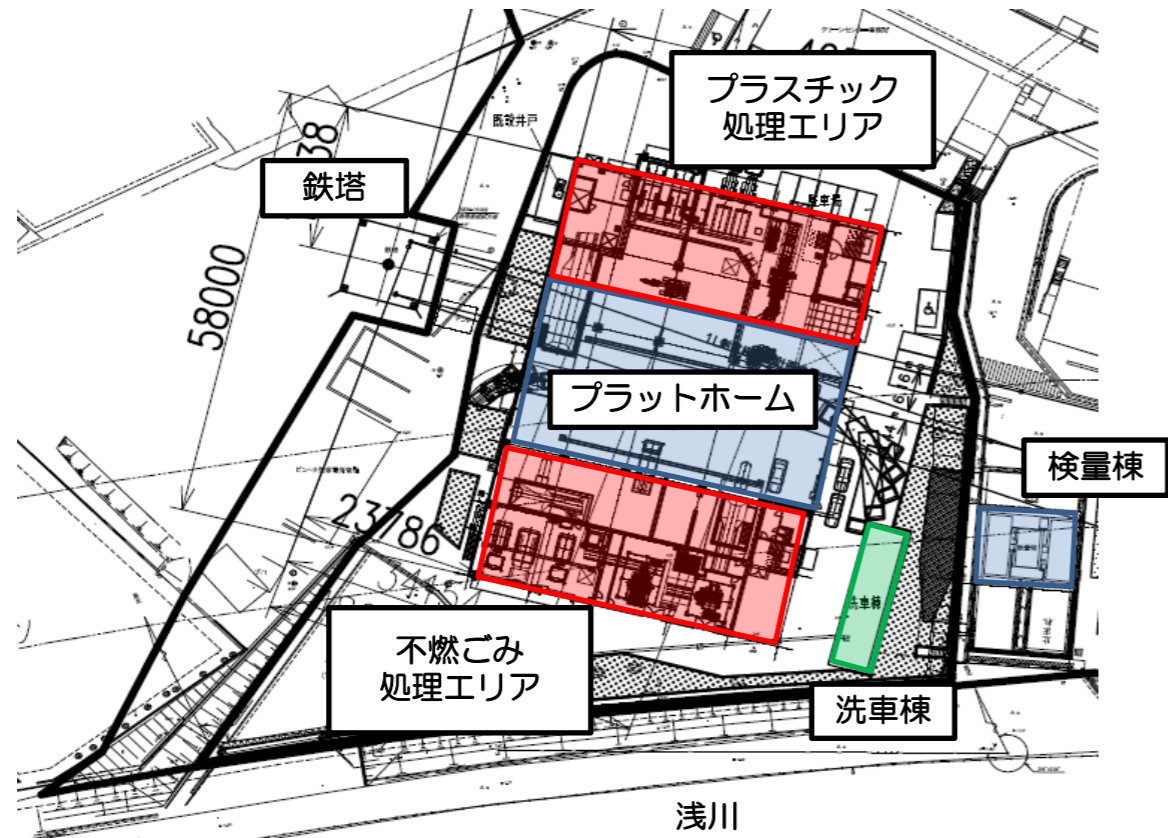

現焼却施設屋上から（9月5日撮影）

工事状況と今後の予定

★8月末時点での工事進捗率は約77%

<令和元年（2019年）>

9月 内装・外壁・建具

10月 キュービクル設置・外構

11月 洗車棟・足場解体・受電

12月 消防・建築関係検査

<令和2年（2020年）>

1月 予備性能試験

2月 安定稼働試験

3月末日 しゅん工・引き渡し




完成予想図



プラットフォーム



手選別ライン（プラスチック）

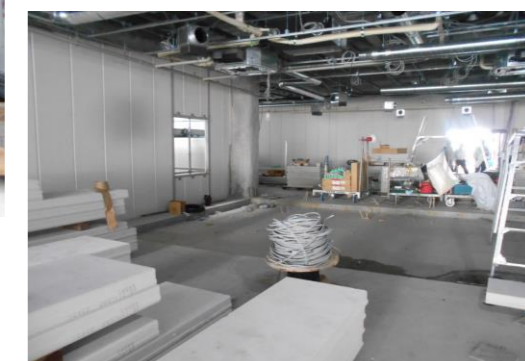

中央制御室
