


工事の進捗状況（令和元年 9 月 5 日現在）

配置図

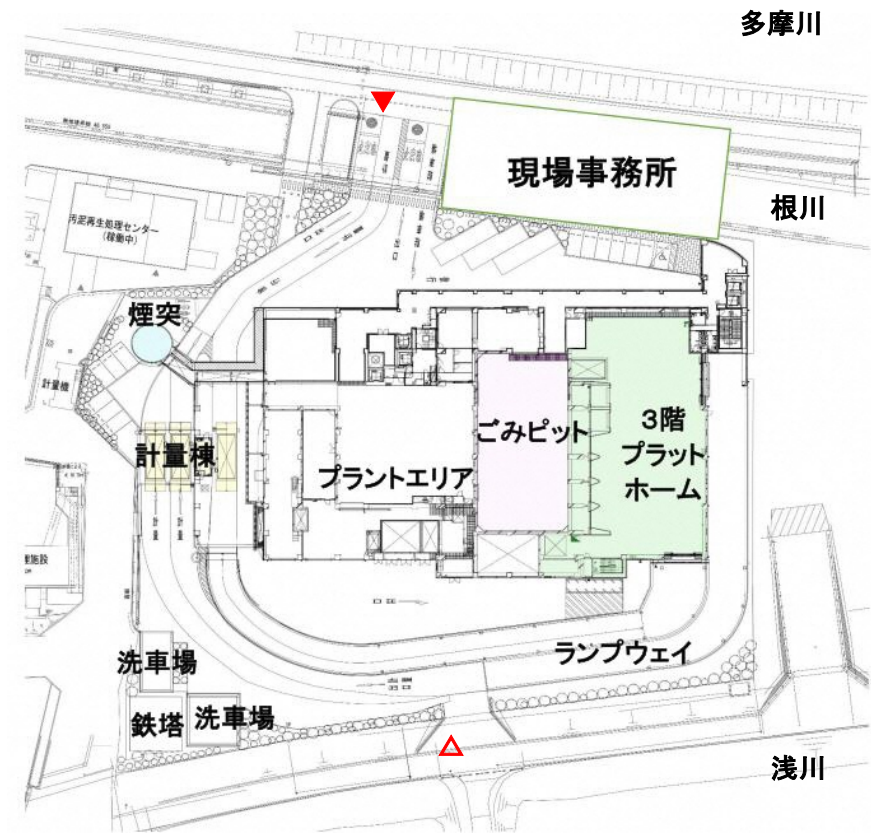

浅川上空から（9月5日撮影）

工事状況と今後の予定

★8月末時点での工事進捗率は約 80%。

<令和元年（2019年）>

- 9月 タワークレーン解体、外壁、建具、煙突の塗装、
- 10月 内装仕上、ランプウェイ舗装、洗車棟、外構、受電
- 11月下旬 消防・建築関係検査
- 12月中旬 試運転開始予定

<令和2年（2020年）>

- 1月下旬 予備性能試験
- 2月下旬 引渡性能試験
- 3月末日 しゅん工・引き渡し




公害防止情報表示盤イメージ



プラットフォーム



中央制御室

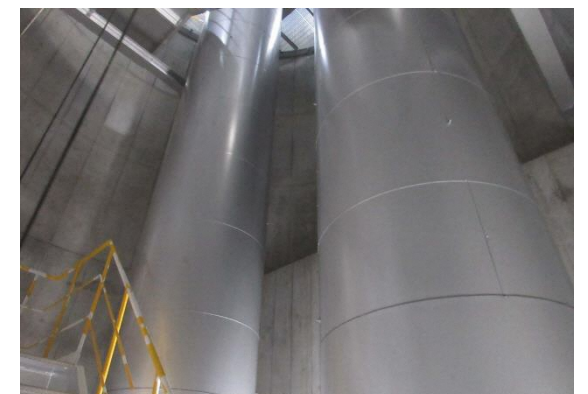

煙突（内部）
