


## 配置図



## 工事現況

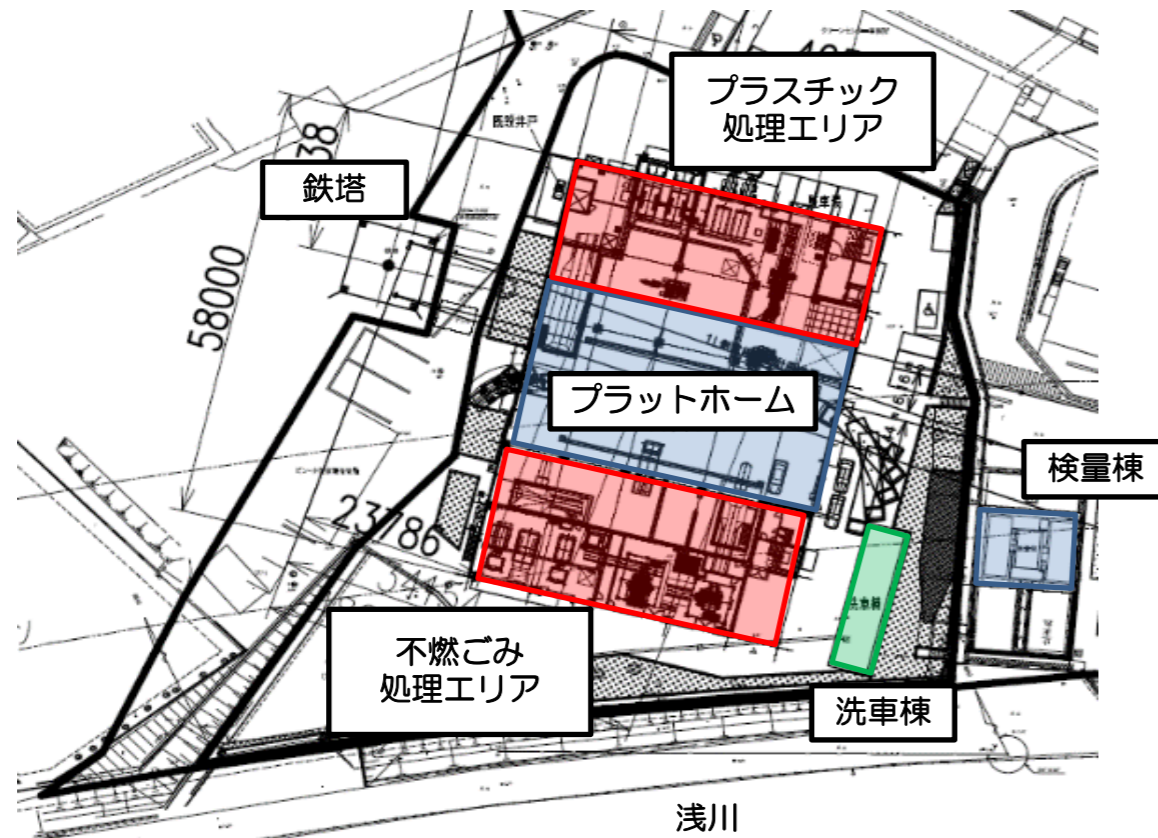

現焼却施設屋上から（11月27日撮影）

## 工事状況と今後の予定

★11月末時点での工事進捗率は約94%

<令和元年（2019年）>

12月 消防・建築関係検査

<令和2年（2020年）>

1月 予備性能試験

2月 安定稼働試験

3月末日 しゅん工・引き渡し




完成予想図



プラットフォーム



手選別ライン（不燃）

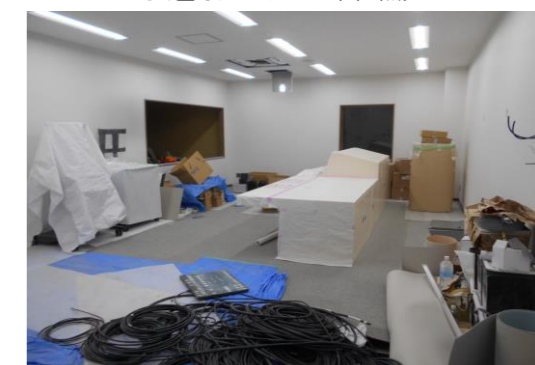

中央制御室
