

(6)南平駅周辺地区 道路特定事業計画


経路名/区分	経路 1-1(旧経路 1-2 の一部) ・1-3(旧経路 1-1)/A I	事業主体	東京都										
路線名	一般都道173号線上館日野線	延長/幅員	500m/16.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 波打ち歩道の解消	—												●
イ. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	—												●
ウ. 透水性舗装の整備	—												●
事業実施に際し配慮すべき重要事項													

現況写真




沿道のスーパーが施設整備を工夫し、歩行者空間と信号待ち滞留空間を提供している

現況断面図



整備後の断面図(イメージ)

計画幅員 16m



経路名/区分	経路 1-2/A I	事業主体	東京都										
路線名	一般都道173号線上館日野線	延長/幅員	500m/16.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 波打ち歩道の解消	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
イ. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウ. 透水性舗装の整備	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
エ. 電線類の地中化	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



※すいすいプラン事業中区間(交差点改良事業)

現況断面図



整備後の断面図(イメージ)

計画幅員 16m
道路構成については検討中

経路名/区分	経路 1-4/AⅡ (新規経路)	事業主体	東京都										
路線名	一般都道上館日野線(第173号)	延長/幅員	95m/16.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 横断歩道前に視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	●											
イ. 電線類の地中化	—												●


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真

・すいすいプランにより交差点改良済み



現況断面図



経路名/区分	経路 1-4/A II (新規経路)	事業主体	東京都									
路線名	一般都道上館日野線(第 173 号)	延長/幅員	95m/16.0m									
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間										
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降
ア. 横断歩道前に視覚障害者誘導用ブロックの設置		●										
イ. 電線類の地中化												●


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真

・すいすいプランにより交差点改良済み



現況断面図




経路名/区分	経路2-1/A I (旧経路 2-1)	事業主体	日野市(道路課)											
路線名	幹線市道 I-11号線	延長/幅員	74m/29.5m											
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降		
ア. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	5箇所 (バス停・横断歩道・七生中入口) 264m	●	●											

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



現況断面図



経路名/区分	経路3-1/AⅡ(旧経路3-1)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	幹線市道Ⅱ-21号線	延長/幅員	36m/5.95m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 踏切部及び接続する南北区間での歩行空間の確保	36m												●


事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・踏切部は鉄道事業者との調整が必要

現況写真



現況断面図



経路名/区分	経路 3-2/AⅡ(旧経路 3-2)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	幹線市道Ⅱ-21号線	延長/幅員	47m/7.5m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 歩行空間確保の検討	47m												●


事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・可能な限り歩道の有効幅員が 2.0mになるように検討する
- ・土地所有者との協議等が必要


現況写真



現況断面図



整備後の断面図(イメージ)



可能な限り
有効 2m を
確保するよ
う努める

経路名/区分	経路3-3/A I (旧経路 3-3)	事業主体	日野市(道路課)									
路線名	幹線市道Ⅱ-21号線	延長/幅員	86m/8.5m									
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間										
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降
ア. 歩道の改良による歩行空間の確保	86m										●	●

事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・可能な限り歩道の有効幅員が 2.0m になるように検討する


現況写真



現況断面図



整備後の断面図(イメージ)



可能な限り有効 2m を確保するよう努める

経路名/区分	経路4/A I (旧経路 4-1)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道L2-1号線	延長/幅員	36m/2.1m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 経路番号 3-1 との接続部における警告用の視覚障害者誘導用ブロックの設置	1箇所	●											

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真

・経路途中に駐輪場がある



現況断面図



経路名/区分	経路5/A I (旧経路 4-2)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市管理道路	延長/幅員	119m/2.9m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 東側車止め部分での視覚障害者誘導用ブロックの設置	1箇所	●											


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真

・経路途中に駐輪場がある



現況断面図




経路名/区分	経路6/AⅡ(旧経路4-3)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道L3号線	延長/幅員	36m/5.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. カラー舗装等により運転手への注意喚起	36m												●
事業実施に際し配慮すべき重要事項													

現況写真



現況断面図




経路名/区分	経路7/AⅡ(旧経路4-4)	事業主体	日野市(道路課)											
路線名	市道L2号線	延長/幅員	188m/5.25~5.75m											
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降		
ア. カラー舗装等により運転手への注意喚起		188m												●

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



現況断面図



経路名/区分	経路8/AⅡ(旧経路4-5)	事業主体	日野市(道路課)									
路線名	市道L2-2号線	延長/幅員	65m/2.0m									
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間										
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降
ア. グレーチングの改良(網目の小さいものに置き換え)	2箇所改良済											

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



- ・南側の路線番号7との接続部(水路部分)での縦断勾配の緩和が求められる
- ・沿道建築物の建替え時に歩道状空地などで歩行空間の拡幅が可能か調整をする

現況断面図



経路名/区分	経路9/A I (旧経路 4-6)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道 L1号線	延長/幅員	124m/7.07~7.5m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 学校の敷地内通路までの区間について、カラー舗装等により運転手への注意喚起	124m												●
イ. グレーチングの改良(網目の小さいものに置き換え)	2箇所	●											


事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・イについて、材料の調達が整った際は前倒しで実施していく

現況写真



現況断面図





経路名/区分	経路11/A I (旧経路 5-2/5-3)	事業主体	日野市(地域協働課)										
路線名	都営住宅敷地内通路	延長/幅員	115m/1.9~2.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討	検討	●	●	●	●	●							


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



現況断面図 (left) and 整備後の断面図(イメージ) (right)

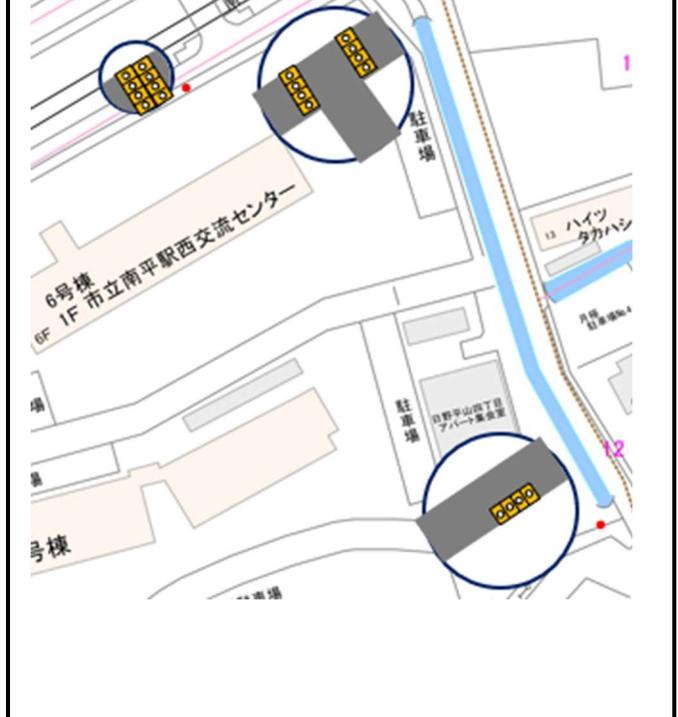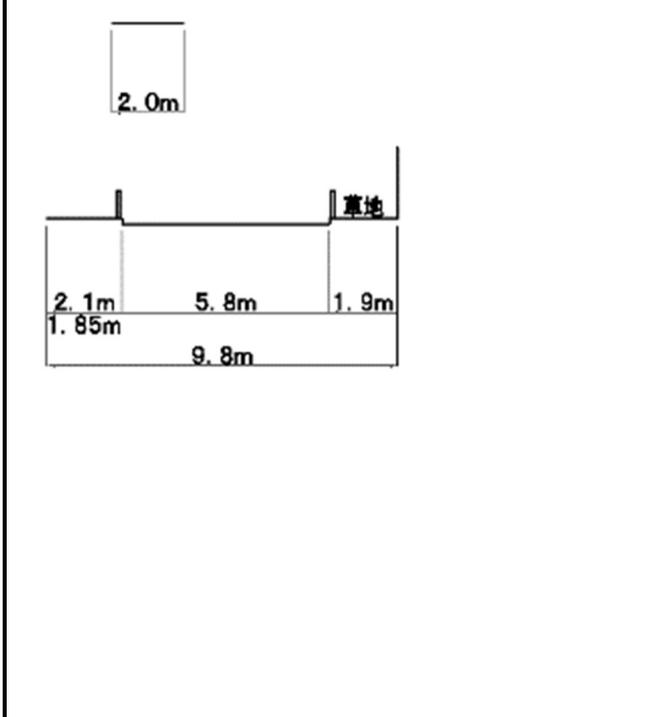

経路名/区分	経路12/BⅡ(旧経路6の一部)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道L7号線	延長/幅員	64m/5.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(カラー舗装やイメージハンプなど)	64m												●
事業実施に際し配慮すべき重要事項 ※南平駅前広場整備計画との整合性を考慮する													
現況写真 													
現況断面図 													


経路名/区分	経路13/BⅡ(旧経路6の一部)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道L7-1号線	延長/幅員	23m/5.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(カラー舗装やイメージハンプなど)	23m												●

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



現況断面図




経路名/区分	経路14/BⅡ(旧経路6の一部)	事業主体	日野市(道路課)											
路線名	市道L7-2号線	延長/幅員	159m/2.35-3.3m											
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降		
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(カラー舗装やイメージハンプなど)		159m												●
事業実施に際し配慮すべき重要事項														

現況写真



現況断面図




経路名/区分	経路15/BⅡ(旧経路7の一部)	事業主体	日野市(道路課)											
路線名	幹線市道Ⅱ-22号線	延長/幅員	171m/4.5-5.15m											
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降		
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(カラー舗装やイメージハンプなど)		171m												●


事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真



現況断面図



経路名/区分	経路16/BⅡ(旧経路7の一部)	事業主体	日野市(道路課)											
路線名	市道L8号線	延長/幅員	124m/4.86-5.05m											
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降		
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(カラー舗装やイメージハンプなど)		124m												●
事業実施に際し配慮すべき重要事項														
<p>現況写真</p> 														
<p>現況断面図</p> 														


経路名/区分	経路17/A I (新規経路)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道M88号線	延長/幅員	159m/11.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	18箇所			●	●								
イ. 大規模改修の際に歩道有効幅員の確保	159m												●

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真 ※第二次推進計画で新規追加経路



現況断面図



整備後の断面図(イメージ)

道路構造を変更し、歩道の有効幅員の確保


経路名/区分	経路18/AⅡ(新規経路)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道M90号線	延長/幅員	78m/8.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 歩道設置等による歩行空間の確保	78m	●											

事業実施に際し配慮すべき重要事項

現況写真 ※第二次推進計画で新規追加経路。令和3年度から令和4年度にかけて実施済み。



現況断面図




経路名/区分	経路19/AⅡ(新規経路)	事業主体	日野市(道路課)										
路線名	市道M10号線	延長/幅員	85m/8.0m										
事業内容	事業量 (延長や箇所数)	整備予定期間											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降	
ア. 歩道設置等による歩行空間の確保	85m	●											
事業実施に際し配慮すべき重要事項													

現況写真 ※第二次推進計画で新規追加経路。令和3年度から令和4年度にかけて実施済み。



現況断面図



南平駅周辺地区

経路名/区分	生活関連経路 全て	事業主体	東京都																			
路線名	—	延長/幅員	—																			
事業内容	事業量 (年あたりの確認回数等)	整備予定期間																				
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降										
ア. 歩車道縁石やインターロッキング、視覚障害者誘導用ブロック等の適切な維持管理により、だれもが安全な歩行空間を維持管理	—																					
イ. はみだし看板や商品対策として巡回の実施	—																					
事業実施に際し配慮すべき重要事項																						

経路名/区分	生活関連経路 全て	事業主体	日野市(道路課)																			
路線名	—	延長/幅員	—																			
事業内容	事業量 (年あたりの確認回数等)	整備予定期間																				
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14以降										
ア. 歩車道縁石やインターロッキング、視覚障害者誘導用ブロック等の適切な維持管理により、だれもが安全な歩行空間を維持管理	適宜実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
イ. はみだし看板や商品対策として巡回の実施	適宜実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ウ. 自転車放置禁止区域内において、放置自転車対策として見回りを強化	適宜実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
事業実施に際し配慮すべき重要事項																						
