


日野市立日野第七小学校 令和6年度 通学路合同点検の危険箇所図

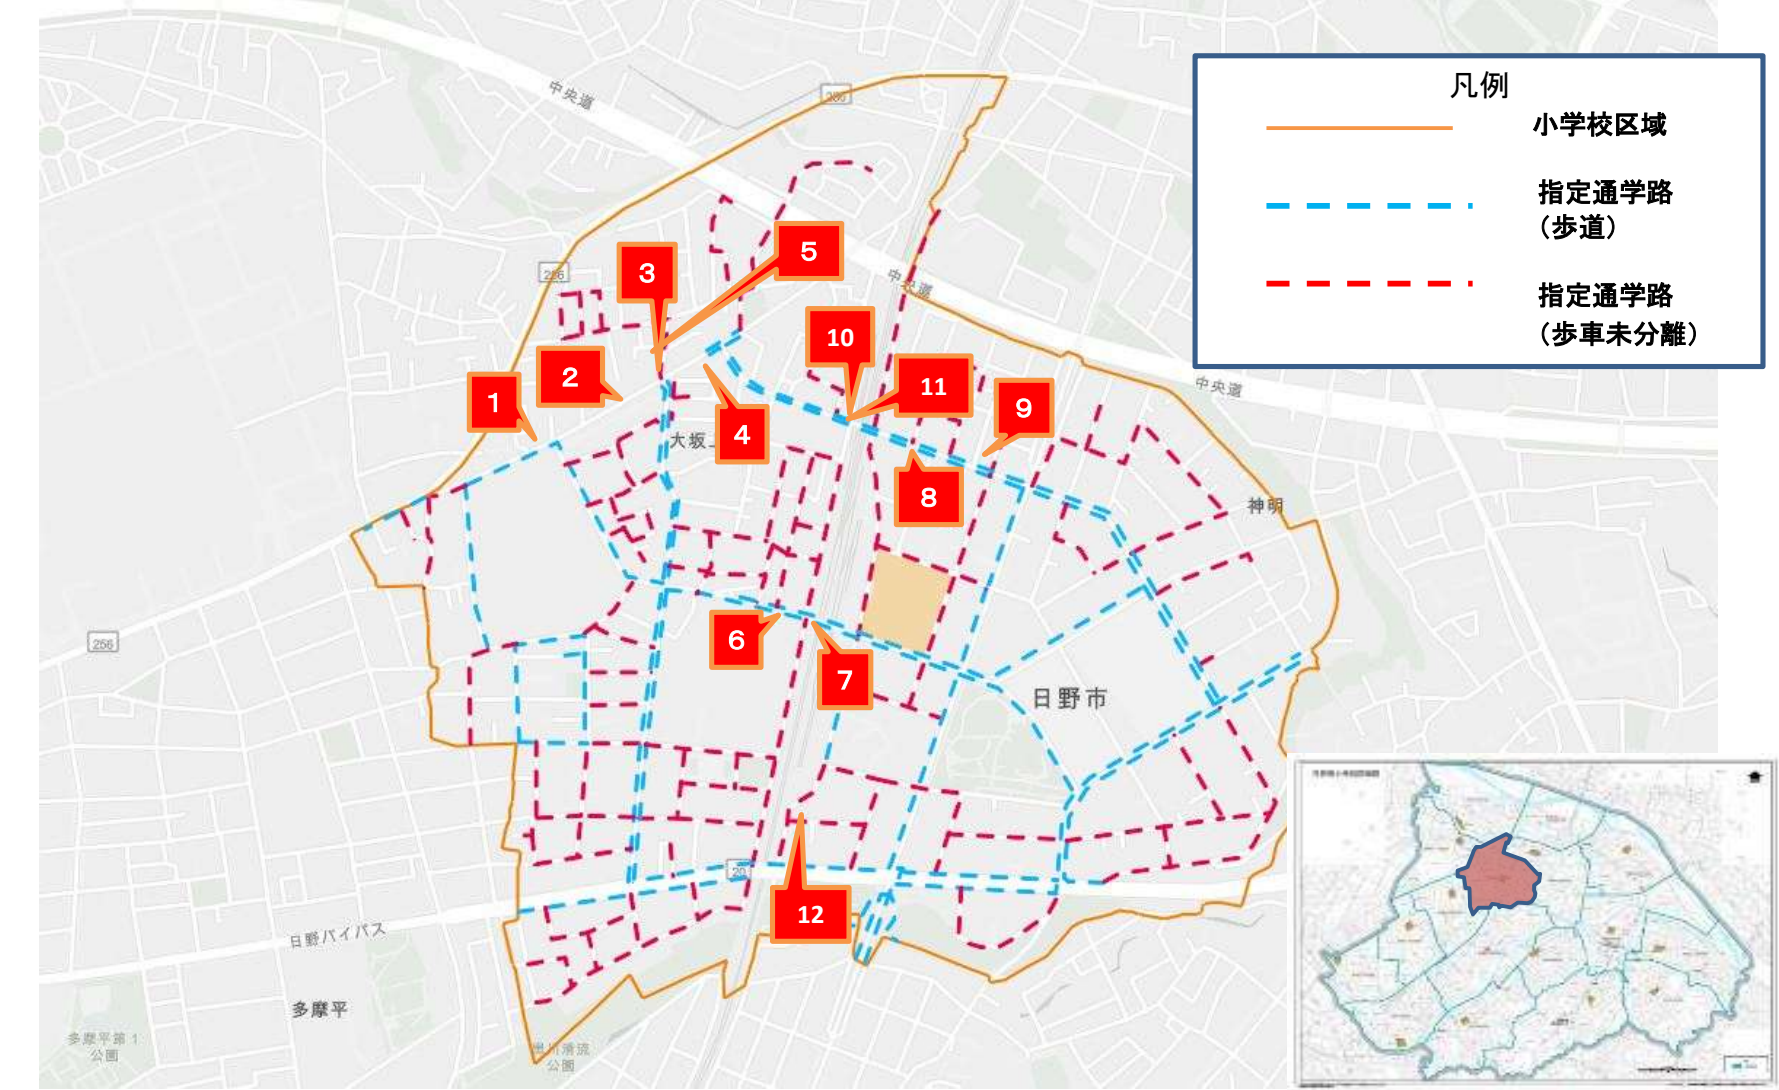

1	日野市大坂上3丁目交差点周辺① 大坂上中学校前の歩道	2	日野市大坂上3丁目交差点周辺② 大坂上通りの北側の 大坂上2丁目6-10～大坂上2丁目5-3までの間	3	日野市大坂上3丁目交差点周辺③ 大坂上3丁目の交差点
【現状】 ・歩道が狭く、通学時間帯は学生(大坂上中、日野高)が横並びで歩いているため、すれ違う際は車道を歩くことになる。雨の日は傘を差して歩くため危険。 【対策メニュー】 ・大坂上中学校、都立日野台高校にて、通行上の注意喚起を継続的にしていただいていることを確認した。		【現状】 ・ガードレール等がなく、歩行が危険。 ・オレンジボールを立てて頂いたが、車両の接触の跡が付いており、ガードレールによる歩行者と車両の分離が必要。 【対策メニュー】 ・店舗や住宅等の出入がありこれ以上の施設設置は難しい。		【現状】 ・信号を無視する自転車がいるため、対策をお願いしたい。 【対策メニュー】 ・現況の車両用信号に不足が無いため、増設はなし。	
4	日野市大坂上3丁目交差点周辺④ 大坂上3丁目交差点周辺の歩道(花壇の近く)	5	日野市大坂上3丁目交差点周辺⑤ 大坂上三丁目交差点	6	実践女子大正門周辺①
【現状】 ・歩道に穴が空いており、つまずき転倒する事故があった。 【対策メニュー】 ・排水機能を確保するため塞ぐことはできない。状況に応じて補修をする。		【現状】 ・十字路のひとつが路地に入る入口になっているが、視界が悪く車同士が鉢合わせになることがあるため、一時停止などで安全確認せずに通りへ出ようとする車が多い。通学路に繋がっている場所のため、対策をお願いしたい 【対策メニュー】 ・歩行者滞留場所の確保困難の為、横断歩道設置せず。 ・停止線再溶着(塗り直し)【済】		【現状】 ・歩道が狭く歩行が困難。雨の日は傘をさすためさらに歩行が困難となり車道を歩くことになってしまう。 ※過去に現地調査のうえ、可能な対策を実施頂きましたが再度確認・対応検討を希望。 【対策メニュー】 ・点検時にこれ以上のハード面での対策が困難なことを確認し、学校側から通行方法の指導を継続していただくことを確認。	

7	実践女子大正門周辺② 実践女子大から矢頭橋へ渡る道路		【現状】 ・線路に面した道路には信号がなく、また、一方の道路には横断歩道がないため止まらない車や自転車が多い。 【対策メニュー】 ・信号機増設により、横断歩行者と右左折者の交錯機会の増加が懸念されるため信号機設置せず。 ・横断歩道は設置上申予定。 ・注意喚起看板については必要に応じて道路管理者に依頼。
8	神明橋周辺① 神明橋周辺の歩道(大坂上方面からセブンイレブン日野神明4丁目交差点)		【現状】 ・歩道が狭く歩行が困難。七小へ向かう生徒と、大坂上中へ向かう生徒のすれ違いが頻繁にありどちらかが車道を歩くことになってしまう。雨の日は傘をさすためさらに歩行が困難。 【対策メニュー】 ・スクールゾーン:う回路の確保困難のため実施せず ・歩道拡幅:車道への影響があるため困難。 ・階段への手すり設置:検討する
9	神明橋周辺③ 神明橋七小方面の横断歩道		【現状】 ・横断歩道の塗装が薄い。車道の◇(ダイヤ)マークと併せて補修が必要。 【対策メニュー】 ・横断歩道、ダイヤマーク:再溶着【済】 ・注意喚起看板:必要に応じて道路管理者へ依頼。 ・減速標示等:対応【済】。
10	神明橋周辺② 神明橋大坂上方面の横断歩道		【現状】 ・横断歩道の塗装が薄い。橋の途中にある車道の◇(ダイヤ)マークと併せて補修が必要。 【対策メニュー】 ・横断歩道、ダイヤマーク:再溶着【済】 ・注意喚起看板:必要に応じて道路管理者へ依頼。 ・減速標示等:対応【済】
11	神明橋周辺④ 神明橋付近の緑色の網フェンス		【現状】 ・穴があいていたりおり補修が必要。穴が広がった場合下の階段に落ちる可能性がある。 【対策メニュー】 ・交通安全施設修繕で対応【済】
12	日野市神明2丁目6-2周辺		【現状】 ・線路沿いの道路で、団地より手前に立っている街路灯。(管理番号21-212) 【対策メニュー】 ・街路灯修繕で対応【済】 ※折れ曲がっていた既存の街路灯を撤去し、照明を電柱に移設。
