豊田小学校校舎改築及び大規模改造工事概要

令和６年３月

＜１.改築工事概要＞【完成】

発注工事名称及び契約工期	1.日野市立豊田小学校東校舎解体工事 工期：令和２年５月～１１月末	3.日野市立豊田小学校東校舎改築建築工事 4.日野市立豊田小学校東校舎改築電気設備工事 5.日野市立豊田小学校東校舎改築給排水衛生設備工事 6.日野市立豊田小学校東校舎改築換気空気調和設備工事 7.日野市立豊田小学校東校舎太陽光発電設備工事
	2.日野市立豊田小学校グラウンド整備工事 工期：令和２年６月～１１月末	工期：令和２年９月～令和４年１月末（令和２・３年度事業）

建築概要		解体校舎（⑪棟）	改築校舎		
構造規模		鉄骨造	鉄筋コンクリート造		
階数		平屋建て	地上３階建て（搭屋部分　地上４階建て）		
高さ		約5m	13.60m　（塔屋15.30m）		
建築面積		約319㎡	1141.55㎡		
延床面積		約319㎡	3090.95㎡		
収容室・面積	１F	【特別支援棟】プレイルーム（61㎡） 相談室（30㎡）、学習室（30㎡） 検査室（30㎡）、職員室（30㎡）	給食室+配膳室（435㎡）、第2保健室（75㎡） 地域交流室（68㎡）、倉庫（計40㎡） トイレ（内部用・外部用）、誰でもトイレ	階別床面積	
				１F	1118.12㎡
	２F	―――	学童クラブ(育成室×３：計407.24㎡)、配膳室 普通教室×３、多目的・少人数教室（各70㎡）	２F	1028.54㎡
	３F	―――	普通教室×３、多目的・少人数教室（各70㎡） 第2音楽室（105㎡）、準備室(40㎡) 第2理科室（105㎡）、準備室(30㎡) 配膳室	３F	900.84㎡
	４F	―――	配膳室	４F	43.45㎡
設備	EV	―――	13人乗り　（給食配膳と兼用）		
	太陽光発電	―――	電池容量 10KW ※屋上にソーラーパネル、昇降口に発電量を示すモニターを設置		
	雨水利用	―――	東校舎のトイレ排水として再利用		
	照明器具	蛍光灯	全室LED照明		

＜２.大規模改造工事概要＞

名　称	大規模改造工事　第Ⅰ期　Ｒ４年度【完了】
場　所	体育館（屋内運動場）
概　要	器具倉庫・トイレ増築（約40㎡）、屋根断熱改修、空調設置、非構造部材転倒防止対策 外壁改修、ｱﾘｰﾅ・舞台照明LED化、音響設備更新、床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼替え、マンホールトイレの設置

名　称	大規模改造工事　第Ⅱ期　Ｒ６年度（予定）
場　所	中央校舎棟　３階・４階・旧給食室　※工事範囲は仮校舎を利用
概　要	屋上防水（ﾊｼｺﾞ含む）、外壁改修、内装・設備・造り付け家具の更新、照明LED化 職員室及び図書室の拡張、教員用の更衣室・シャワー室整備

名　称	大規模改造工事　第Ⅲ期　Ｒ７年度（予定）
場　所	中央校舎棟　１階・２階　、プール棟　※校舎の工事範囲は仮校舎を利用
概　要	校舎：外壁改修、内装・設備・造り付け家具の更新、照明LED化 プール棟：屋根塗装、外壁改修、設備・家具更新、照明LED化、温水シャワー整備、トイレ改修

＜３.工事スケジュール表（予定）＞

関連工事	～R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
解体工事					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ拡張					
改築工事	新校舎運用開始				
大規模改造Ⅰ期（体育館）					
大規模改造Ⅱ期（中央校舎3・4階）					
大規模改造Ⅲ期（中央校舎1・2階）					
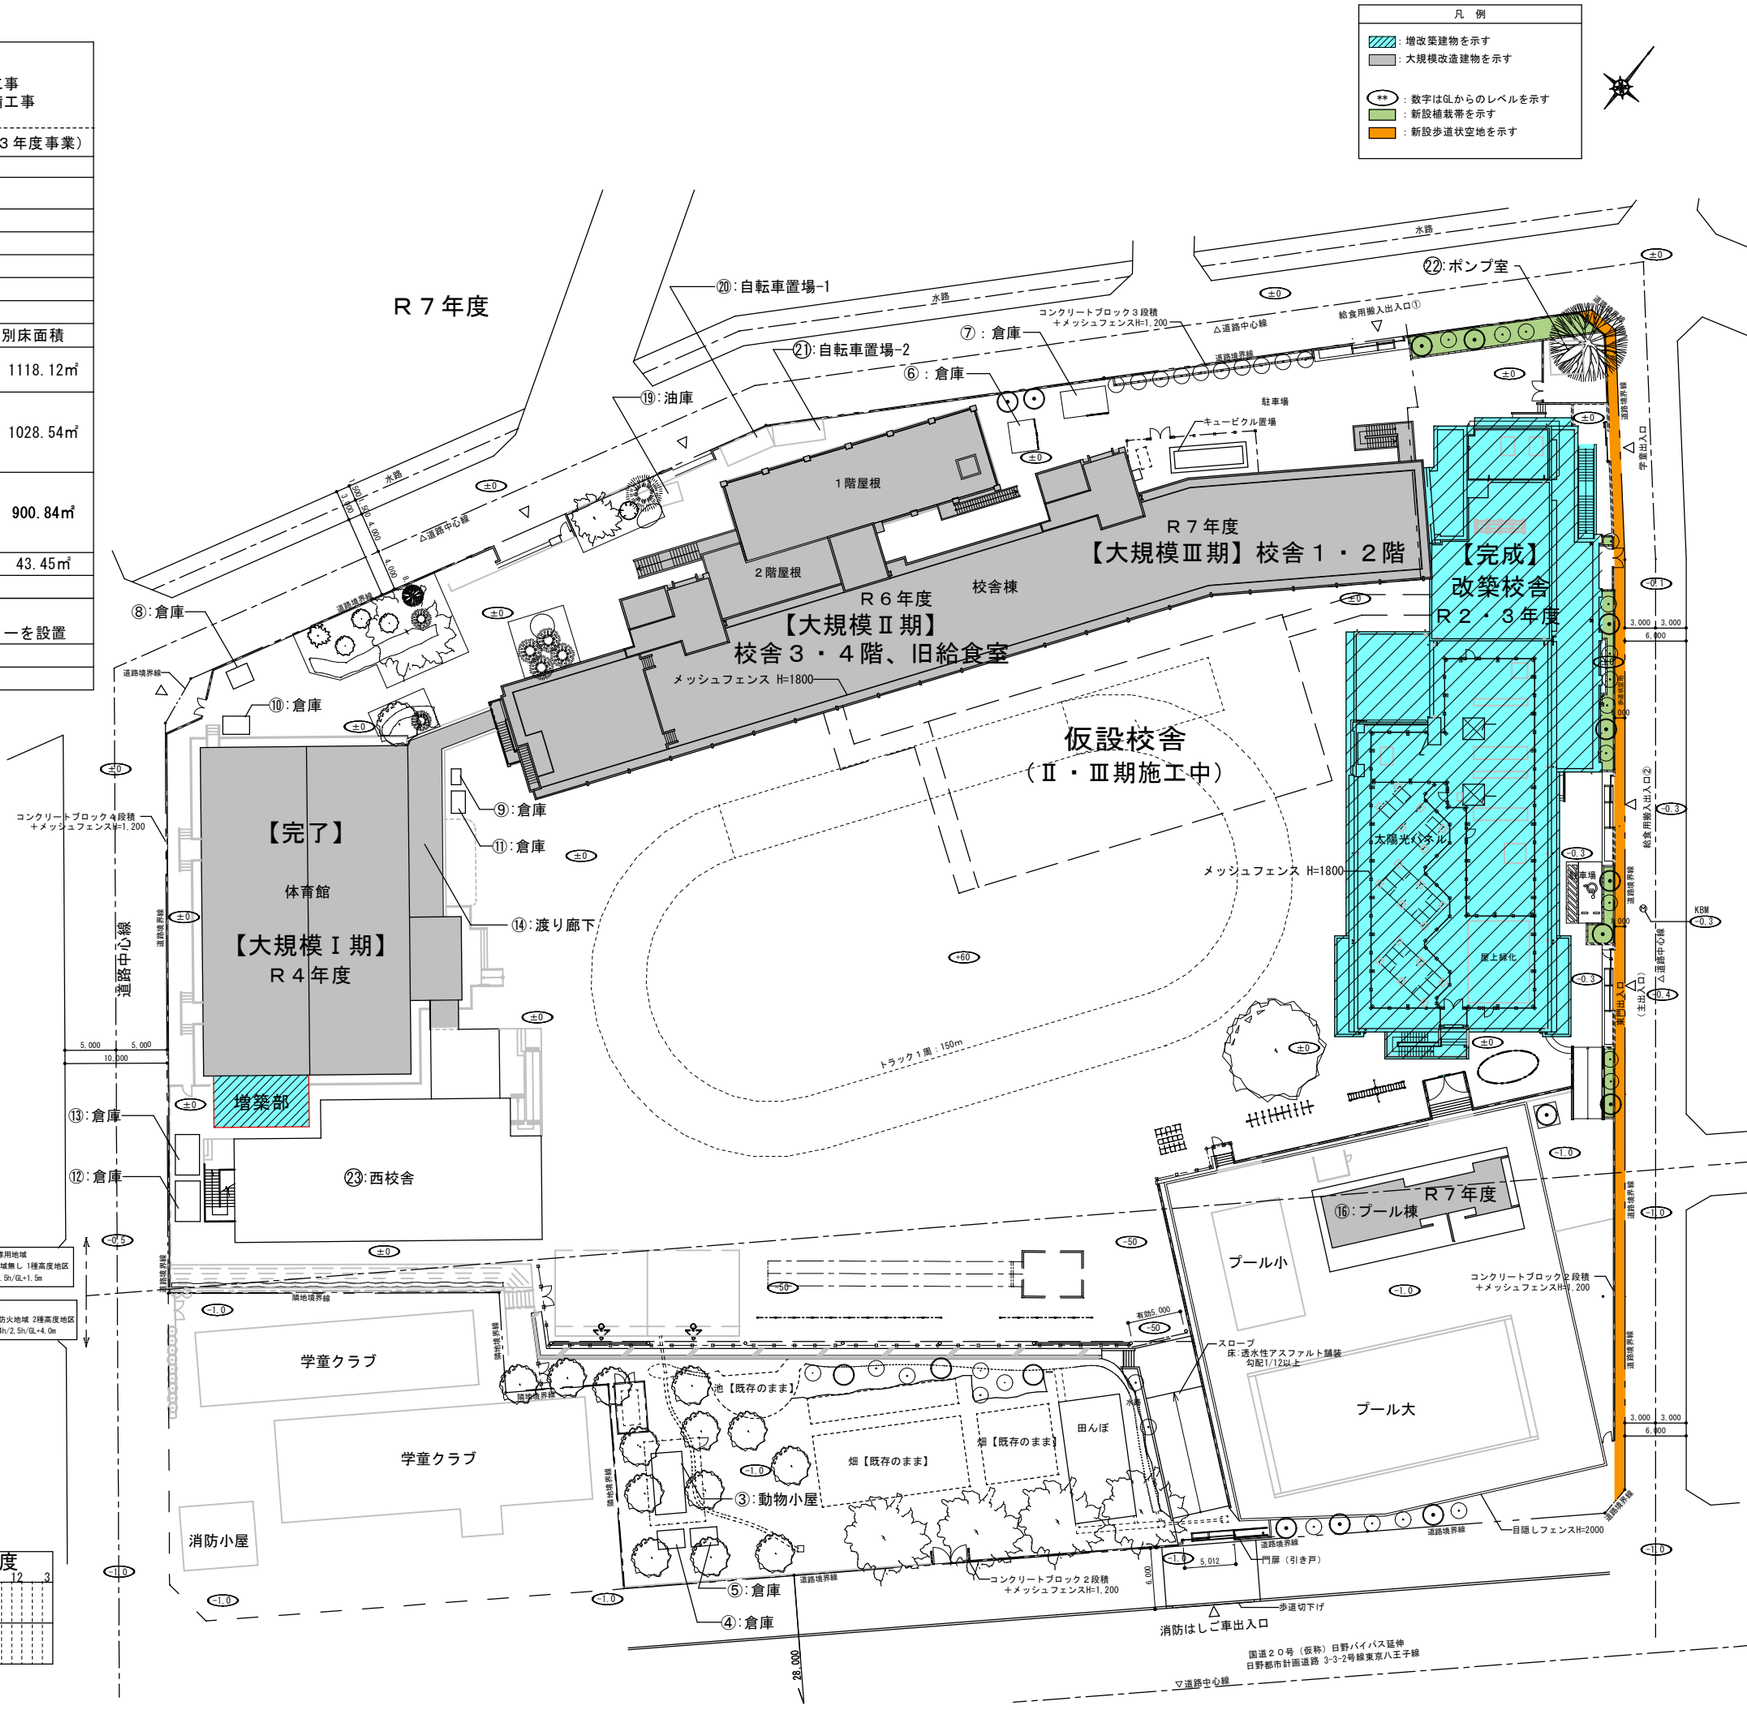
関連事業	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
仮設校舎				建設工事 仮設校舎使用	撤去工事 仮設校舎使用	解体工事
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備
